



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ

งานก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐๑ เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร

ระยะเวลา ๑,๒๐๐ วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ค่าก่อสร้าง ๔๓๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
สัญญาจ้าง-แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ คค ๐๗๐๗.๒/๑๐๑๓ เรื่องแจ้งอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า พีอีจี-อทาโซ

สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ สกส.๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ ตามรูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในภาพรวมดังนี้

แผนงานประจำเดือน ๖.๓๕ %	ผลงานประจำเดือน ๖.๓๗ %
แผนงานสะสม ๖๔.๒๙ %	ผลงานสะสม ๕๔.๓๘ %
	ซ้ำว่าแผน ๙.๙๑ %


ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง



งานเทคอนกรีตหัวเสา
P8



งานเทคอนกรีตผนัง
P8

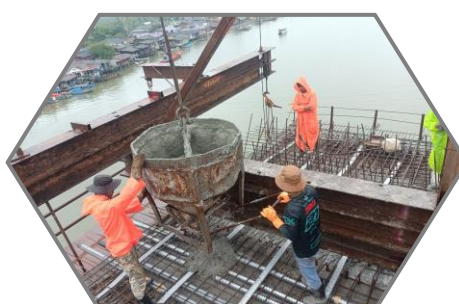

งานเทคอนกรีตพื้นบน
Balance P9 Type D-D'



เทคอนกรีตงานถนน

“คุณภาพเป็นหนึ่งใน คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรประชาชน”

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๕๕๑๕๕๒๗ โทรสาร ๐๒-๕๕๑๕๕๓๔
<https://www.drr-tamalang.com>
